

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	国投集团国有企业资本注入						
主管部门	连城县国投集团		实施单位		连城县连发城市建设有限公司		
财务负责人	李金海		项目负责人		曹小明		
项目实施周期	2020年04月25日-2020年07月25日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	130	130	79.07	10	60.82	6.08
	一般公共预算拨款	130	130	79.07	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—

			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年建设完成连城县退役军人服务中心改造工程项目，建设完成地面翻新、屋面修整、水电维修改造、内外墙翻新、门窗翻新、吊顶安装等内容。				本年建设完成连城县退役军人服务中心改造工程项目，建设完成地面翻新、屋面修整、水电维修改造、内外墙翻新、门窗翻新、吊顶安装等内容。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
			地面翻新工程完成工程量	根据项目预算完成工程量	≤1010.00平方米	1010	3	3	无
			屋面修整工程完成工程量	根据项目预算完成工程量	≤405.00平方米	405	3	3	无
			水电维修改造工程完成工程量	根据项目预算完成工程量	≤1010.00平方米	1010	4	4	无
		数量							

绩效指标


产出指标

成本指标	地面翻新工程投入资金	根据项目 建设资金 预算投入 28.2万元	≤ 28.2 28.2 万元	28.2	3	3	无
	屋面修整工程投入资金	根据项目 建设资金 预算投入 46.8万元	≤ 46.8 46.8 万元	46.8	4	4	无
	水电维修改造工程投入资金	根据项目 建设资金 预算投入 8.9万元	≤ 8.9 8.9 万元	8.9	3	3	无
	内外墙翻新工程投入资金	根据项目 建设资金 预算投入 27.2万元	≤ 27.2 27.2 万元	27.2	4	4	无



指标

内外墙翻新工程完成工程量	根据项目预算完成工程量	≤ 2600.00 平方米	2600	4	4	无
门窗翻新工程完成工程量	根据项目预算完成工程量	≤ 210.00 平方米	210	3	3	无
吊顶安装工程完成工程量	根据项目预算完成工程量	≤ 900.00 平方米	900	3	3	无
质量指标	按质量要求施工	100%符合工程质量建设要求 $\leq 100.00\%$	100	5	5	无
时效指标	项目建设进度	根据项目工作计划完成天数 ≤ 92.00 天	92	5	5	无

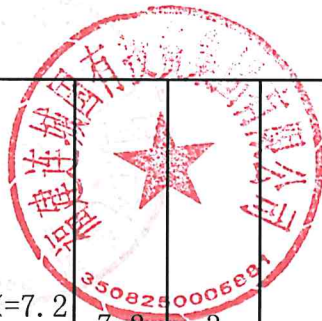

		门窗翻新工程投入资金	根据项目 建设资金 预算投入 7.2万元	≤ 7.2 0万元	7.2	3	3	无
		吊顶安装工程投入资金	根据项目 建设资金 预算投入 11.7万元	≤ 11.7 0万元	11.7	3	3	无
效益 指标	社会效益 指标	改造后退役 军人服务中心 可使用办公 面积	建筑 面积 为 1010平方 米	≤ 1010 0.00平方 米	1010	15	15	无
	可持续影 响指标	项目使用年 限	根据改造 后工程质 量预计使 用年限	≤ 10 00年	10	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人管理中心工作人员满意度	往年标准95%	96	96	10	10	无	
	总 分							100	96.08	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优		
相关 建议 意见	存在问题	1、建设资金未及时拨付我司 2、工程已验收还没审核								
	建议意见	1、建议建设资金及时拨付我司 2、建议跟进审核进度								
说明	无									

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。
